Rahmenterminplanung zum Bauvorhaben 740 m Gleise

LV 5: Auflösung DKW 58 in 2 EW (W58, W59) - Baustufe 1.2
LV 6: Gradientenanpassung - Baustufe 1.1
LV 7: Verlängerung 740 m Gleise 59 und 60 - Baustufe 1.3
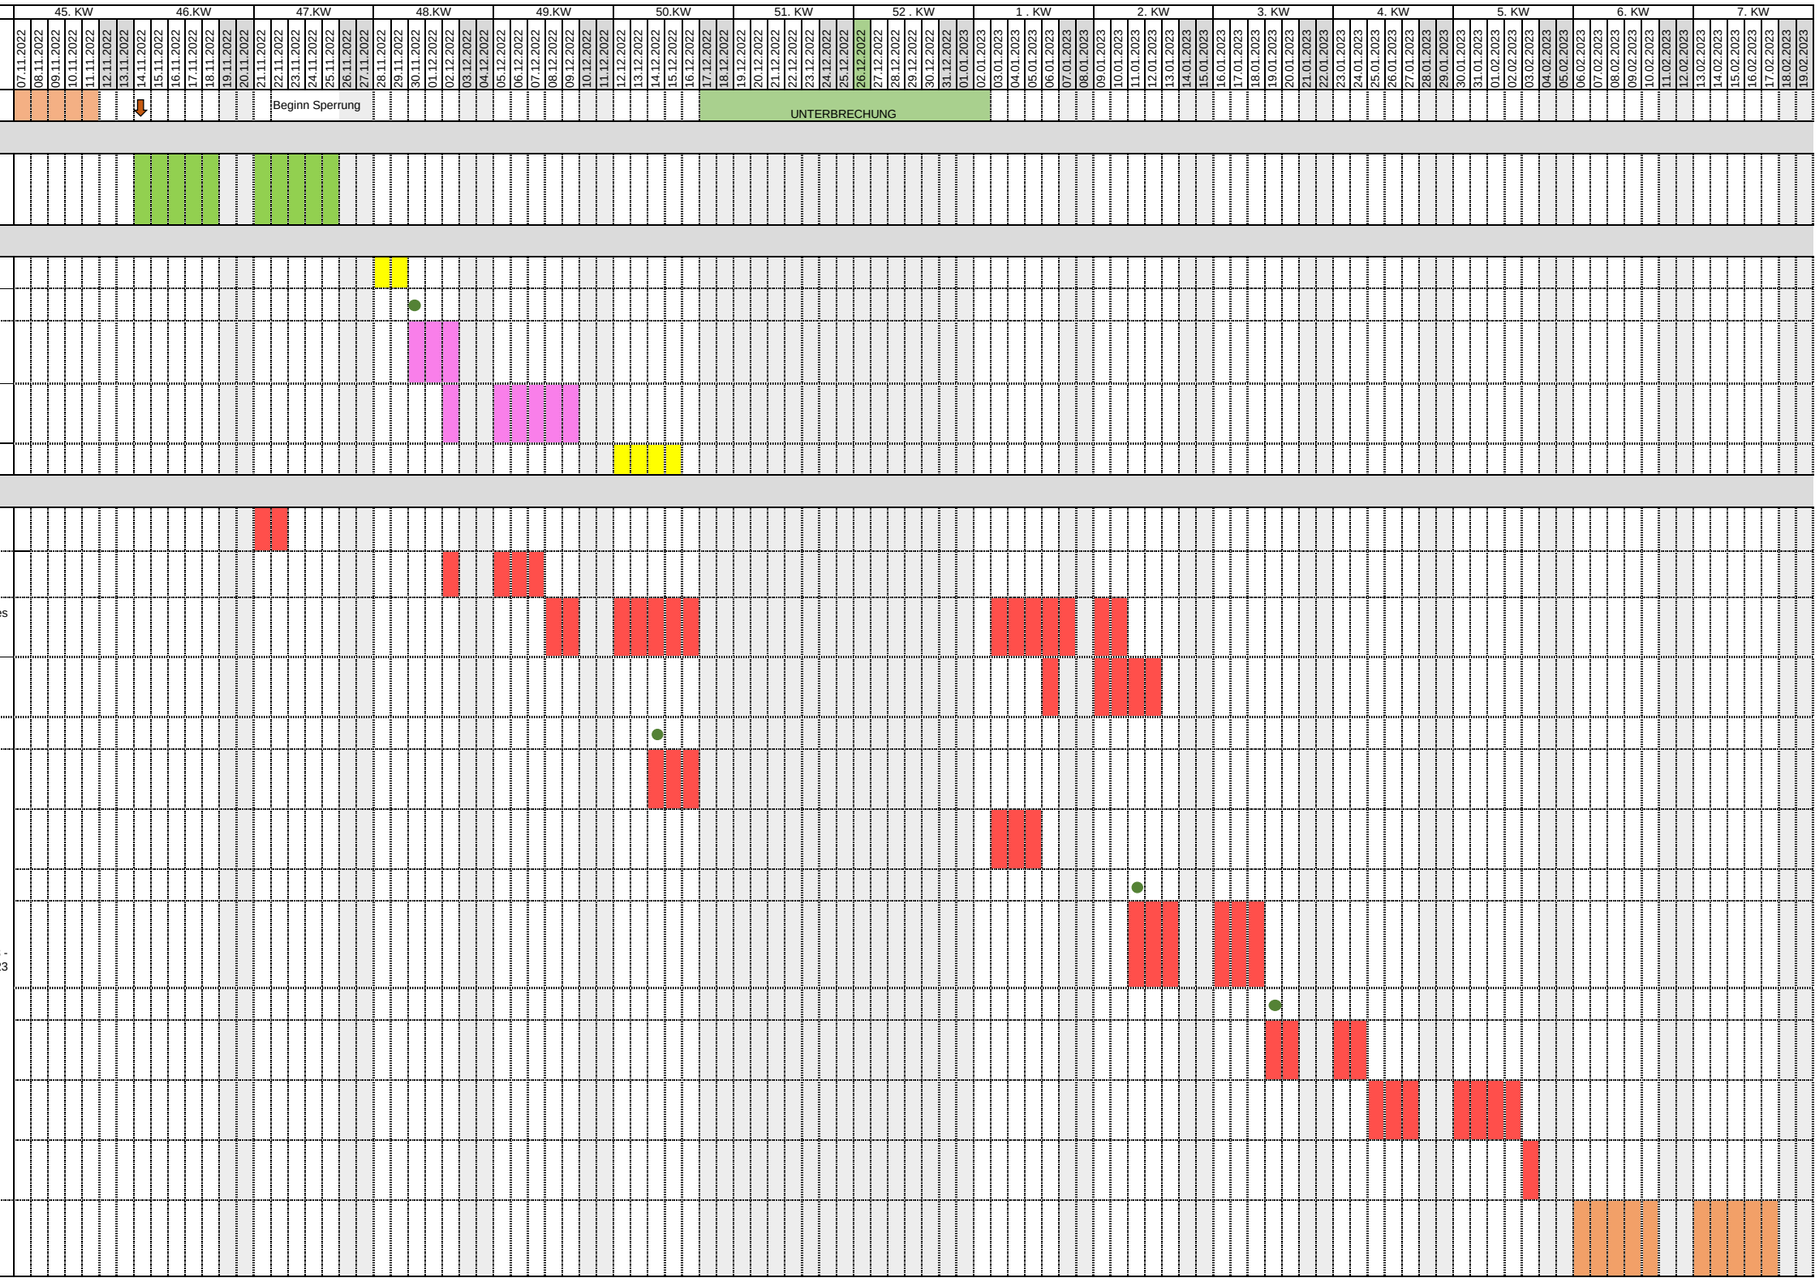
Lfd Nr	Arbeitsschritt	Sperrbereich	
0	Bauanfang - BE einrichten	14.11.22 ab 08:00 Uhr	
	Baustufe 1.1: Gradientenabsenkung W62 - W61 - W64:		
1	Rück- und Wiedereinbau der Weichen in Großteilen + Wvb einschl. Schotter und Erdarbeiten / Planum für neue Höhenlage, Einbau Querungen für Gleisfeldbeleuchtungen	Totalsperrung Grz W60 bzw. Grz DKW 58 bis Grz W70 bzw. 30 m vor WA W89	
	Baustufe 1.2: Auflösung DKW 58 in 2 EW (W58, W59) :		
LST 1	Baufreiheit LST		
2	Lieferung W58 und W59		
3	Rückbau W58 incl. Anschlüsse und Erdarbeiten/ Herstellung Planum für neue Höhenlage	Totalsperrung Grz W53 / Grz W 55 / Gl. 11 40 m vor Grz W57 bis Grz W61 / Grz W72 / Gl. 28 bis Infrastruktur-grenze	
4	Weichenmontage und Einbau im "Loch" W58 und W59 incl. Anschlüsse (auch bis WA W40) einschl. Stopfarbeiten		
LST 2	Anbau und Inbetriebnahme LST		
	Baustufe 1.3: Verlängerung 740 m Gleise Gl. 59 und Gl. 60 :		
5	Bauvorbereitende Suchschachtungen (Lage Stromversorgungskabel, Lage Trink- und Abwasserleitung)		
6	Herrichtung bauzeitlicher Verkehrsweg zum Stw. Wmt, bauzeitliche Umverlegung Kabel DB Energie Stw Wmt		
7	Rückb. Gl. 26 und Erdarbeiten (Abtragung Ablaufberg) einschl. Einbau Stützwand und Treppe am Stw Wmt		Querung des Verkehrsweges Stw Wmt Gl. 26 ist ständig sicher zustellen.
8	Umverlegung Ver- und Entsorgungs-leitungen Stw Wmt		
9	Lieferung Weiche W46		
10	Rückbau Weichenreste W97 und Anschlüsse Gl. 59 und Gl. 60, Erdarbeiten / Herstellung Planum W46 bis Bestandsgleise 60 und 59	Totalsperrung von Grz W59 - Grz W72	Totalsperrung von Grz W98 - Gleis 59 in Höhe Mast 25-23 und Grz W114 - Gleis 60 in Höhe Mast 25-23
11	Weichenmontage und Einbau im "Loch" W46 sowie Gleise 60 und 59 von W46 bis Bestandsgleise 60 und 59		
12	Lieferung Weichen W40 und W41		
13	Herstellung Planum, Weichenmontage und Einbau im "Loch" W40 und W41, Herrichtung Verkehrsweg Stw Wmt einschl. Beleuchtung, anschließend Einbau Gl. 26 einschl. Stopfarbeiten		
14	Lieferung Weiche W 42		
15	restliche Erdarbeiten / Herstellung Planum, Weichenmontage und Einbau im "Loch" W42	Sperrung Grz W40	
16	restliche Erdarbeiten / Kabeltiefbau einschl. Kabelquerung vom RS III bis KK neben neuem Gl 60 / Herstellung Planum und Einbau Gleis 60 bis WA W46		
17	Stopfarbeiten Weichen W42 und W46 sowie Gleis 60 und Anschlüsse an Bestandsgleise 59 und 60		
18	Restleistungen Verlängerung 740 m Gleise wie Wiederherstellung BÜ, Herstellung restl. Dienstwege, Randwegprofilierung, Beleuchtungsanlage, Kabel DB Energie in Endlage	nach Absprache
