Rahmenterminplanung zum Bauvorhaben 740 m Gleise

LV 8: Verlängerung 740 m Gleise 61 und 62 Baustufe 2
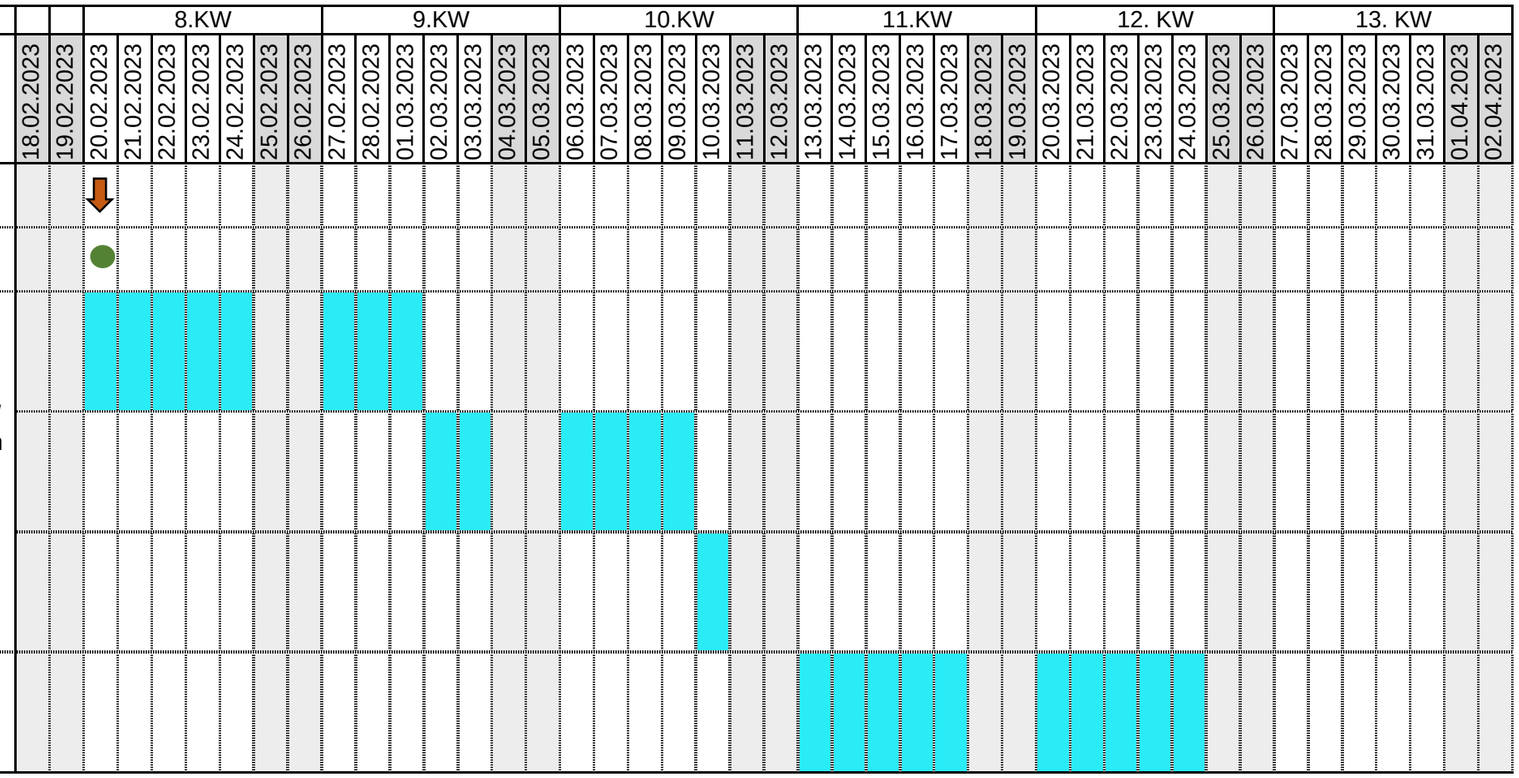
Lfd Nr	Arbeitsschritt	Sperrbereich
	Bauanfang	02.01.23 ab 08:00 Uhr
1	Lieferung Weiche W44	
2	Rückbau Weiche W114 einschl. Anschlüsse Rest ehem Gl. 60, Gl. 61 und Gl. 62, Erdarbeiten / Herstellung Planum für Weiche 44 und Gleise 61 und 62	Totalsperrung von Grz W98 / Grz W125 - Gleise 61 + 62 in Höhe Mast 25-23 und Sperrung Stammgleis neue Weiche W 42
3	Weichenmontage und Einbau im "Loch" W44 sowie Einbau Gleise 61 und 62	
4	Stopfarbeiten Weiche W44 und Gleise 61 und 62	
5	Restleistungen Verlängerung 740 m Gleise wie Herstellung Dienstwege und Randwegprofilierung, Beleuchtungsanlage etc.	nach Absprache
